

GESTIÓN DE PROYECTOS

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

GESTIÓN DE PROYECTOS

ÍNDICE

Handoff Ventas

Activación del Cliente

Kickoff

Planificación de Fases

Puntos de Contacto

Seguimiento del Proyecto

Gestión de Crisis

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

TU CAM

Onboarding

- Definir objetivos del proyecto
- Determinar recursos, personas y otros detalles del proyecto
- Obtener aprobación para iniciar



ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

**¿De verdad necesito un proceso de
onboarding para nuevos clientes?**

TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

PUNTOS DE
CONTACTO

GESTIÓN DE
CRISIS

KICKOFF

TU CAM

Handoff de Ventas a Operaciones

Este traspaso es especialmente necesario, ya que establece el tono de la relación con nuestro nuevo cliente.

Una onboarding sin problemas puede ayudar a demostrar que somos la persona con la que hay que trabajar... o puede causar en los clientes el remordimiento del comprador si se hace de forma desordenada.

Para evitar esto último, podemos tener en cuenta los siguientes puntos:



TU CAM

Handoff de Ventas a Operaciones

1. El alcance del proyecto. El traspaso de ventas debe incluir el alcance del proyecto.

¿Qué está pagando el cliente? ¿Cuáles entregables recibe? ¿Cuál es el plazo de entrega (fases)? ¿Cuál es el objetivo del cliente?

2. Background. Detalles esenciales sobre el cliente que el equipo de ventas descubrió durante el proceso de consultoría y venta.


Pueden ser datos como los objetivos del proyecto, el público objetivo, las preferencias del cliente, sus gustos/disgustos y cualquier otro dato significativo para ofrecer un excelente servicio al cliente.

Una vez que el equipo de ventas cierra un acuerdo, esta reunión se debe llevar a cabo lo antes posible.

TU CAM

Handoff de Ventas a Operaciones

Resumen y herramientas recomendadas



TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS


TU CAM

Activación interna del cliente

El objetivo de este paso es mantener todo en orden para que el proyecto fluya.

El proceso de activación interna de cliente es simple pero garantiza una estructura sobre la que podemos trabajar.

Este es nuestro paso a paso recomendado:



TU CAM


Activación interna del cliente

Creación de carpetas

Cada cosa en su lugar en el Drive.

¿Cuántas veces se nos ha perdido un documento y pensamos... “si tuviera organizadas mis carpetas”?

Cada minuto invertido en organización tendrá retorno y aportará estructura.

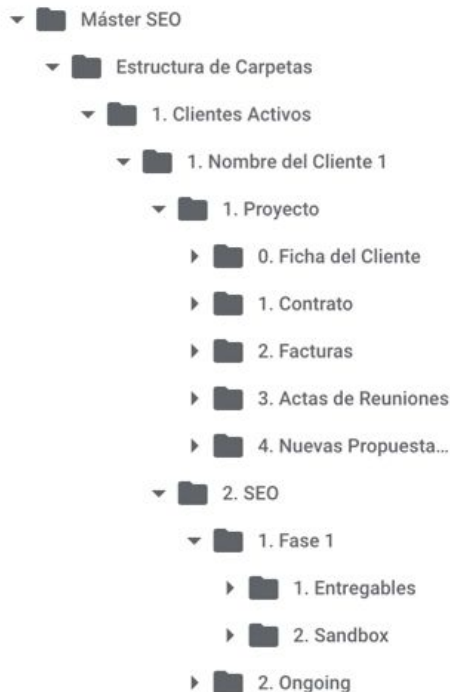

TU CAM

Activación interna del cliente


Creación del Proyecto en Software de Gestión

Quién hace qué y cuándo.

El objetivo de esta fase es que las tareas sean realizadas (get things done) con calidad y en el tiempo propuesto.

No importa si es con Trello, Todoist o cualquier otra herramienta.


Te muestro dos caminos, válidos los dos...



TU CAM

Activación interna del cliente

Herramientas tipo Trello (Tableros)

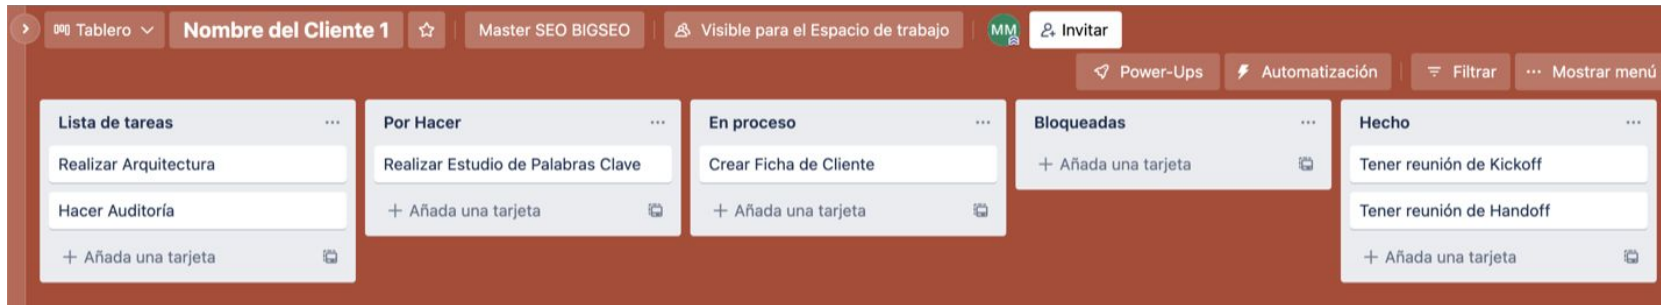

TU CAM

Activación interna del cliente

Herramientas tipo Listas de Tarea

2/5

MM

Nombre de Cliente 1

Añadir tarea

Onboarding del Cliente 1

Crear Ficha de Cliente

Añadir tarea

Tener Reunión de Kickoff

Tener Reunión de Handoff

Fase 1 3

Realizar Estudio de Palabras Clave

Realizar Arquitectura

Hacer Auditoría Técnica

Añadir tarea

TU CAM

Activación interna del cliente

Creación de la Ficha del Cliente

Toda la información del cliente

La Ficha del Cliente es importante porque es el lugar de consulta en el que podemos reconectar con la realidad del proyecto...

¿Por qué nos han contratado? ¿Qué quieren lograr?
¿Cuáles son los indicadores de éxito? ¿Puntos de
Contacto? ¿Accesos?

MASTERSEO by BIGSEO


Plantilla de Ficha del Cliente

Parte 1 - Información General			
Nombre del Proyecto			
Alcance del Proyecto			
Servicio Contratado	Equipo Asignado	Project Manager	SEO Manager
Entregables			
Objetivos del Cliente			
Objetivos del Proyecto con			
Recursos entregados por el cliente			
Stakeholders del Cliente			
Nombre	Cargo	Empresa	Contacto

TU CAM

Activación interna del cliente

Resumen y herramientas recomendadas



TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

TU CAM

1. Email de **Kickoff**

TU CAM

Email de Kickoff | 24 horas después de la firma del contrato

Elementos que debería incluir:

- Una fecha sugerida para el **encuentro** (*llamada, videollamada, reunión*).

Es ideal que esta fecha sea como mínimo una semana después de enviado el email.



TU CAM

Email de Kickoff | 24 horas después de la firma del contrato

Elementos que debería incluir:

- Las personas (stakeholders) que deben participar en la reunión.

Es vital que asistan todas las personas que realmente van a intervenir en el proceso, tomarán decisiones y serán interlocutores:

- Persona que tenga claro el **propósito** de la empresa y pueda establecer **objetivos** (CMO, CEO, Founder)
- Persona que será el canal de **comunicación, aprobaciones** y seguimiento interno de tareas (CMO, Project Managers, SEO Manager)
- Técnicos **web**
- Otros stakeholders que identifiques.

TU CAM

Email de Kickoff | 24 horas después de la firma del contrato

Elementos que debería incluir:

- **Agenda de la reunión:**

El objetivo es darle orden y estructura a la reunión, además cada punto de la agenda tiene un responsable, algunos de ellos pueden ser del cliente y hay que darle tiempo para que se lo prepare.

Ejemplo de agenda:

- Introducción a la Agencia
- Background de la empresa - *a cargo de CLIENTE*
 - Tipología de empresa
 - Tipo de cliente al que se dirigen
 - Modelo de generación de negocio
 - Información buyer persona campeón
 - Propósito / servicios o productos top
 - Competidores
 - Estacionalidad
- Expectativas del proyecto / Indicadores de Éxito - *a cargo de CLIENTE*
- Rápido repaso del alcance del proyecto contratado (SOW)
- Roles y responsabilidad de los equipos
- Siguiendo pasos y acciones

TU CAM

2. Reunión de **Kickoff**

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Introducción a la Agencia

El objetivo de esta sección es informar al cliente la metodología empleada durante la ejecución del proyecto. Ejemplo:

- Cómo se organiza el trabajo
- Cómo se reporta / puntos de control
- Cómo se controla el consumo del fee

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Background de la empresa

El objetivo es profundizar en el conocimiento de tu cliente y lo que hace.

Con la información obtenida en esta sección se empezará a construir la *Ficha de Cliente*.

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Background de la empresa

Ejemplo de preguntas que puedes hacer después de la exposición del cliente:

- *¿Qué herramientas y plataformas utiliza actualmente en sus esfuerzos de marketing?*
- *¿Sus objetivos priorizan los leads, los clientes o los ingresos?*
- *¿Cuál es su valor medio de vida del cliente (LTV)?*
- *¿Cuál es su objetivo de LTV?*
- *¿Dispone de buyer personas de clientes? ¿Quién es su cliente ideal?*
- *¿Cuánto le cuesta adquirir un cliente?*

- *¿Qué retorno de la inversión ha visto en sus actuales esfuerzos de marketing? ¿En qué está invirtiendo actualmente?*
- *¿Qué porcentaje de sus clientes se genera a través de métodos online?*
- *¿Cuáles son los pasos de su proceso de venta? Cuáles son las dudas más comunes que tienen los clientes?*
- *¿Cómo encuentra actualmente a los clientes potenciales? ¿Sabe cuál es su coste por cliente potencial? ¿Sabe cuál es su tasa de conversión de clientes potenciales?*

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Expectativas del Proyecto / Indicadores de éxito

Es probable que tenga una buena idea de los objetivos del cliente a partir del proceso de venta, pero aproveche esta reunión para profundizar en estos objetivos y asegurarse de que son específicos y medibles para poder demostrar los resultados a su cliente.

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- Atraer a X visitantes únicos al mes.
- Aumentar X% los leads calificados.

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Repaso del alcance del proyecto contratado (SOW)

Es vital recalcar durante esta parte de la reunión en los ítems/horas que entregarás durante la ejecución del proyecto.

Debe coincidir con el contrato que has firmado con el cliente.

No debe quedar duda sobre las siguientes cuestiones

- ¿Cómo se distribuye el fee del cliente?
 - ¿Cuántas horas de SEO?
 - ¿Cuántas horas de gestión?
 - ¿Cuántos contenidos?

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Roles y responsabilidades de los equipos

Hay ciertas cosas que tanto tú como tu cliente tendréis que cumplir, por lo que es importante que sepas quiénes son las personas "a las que hay que acudir" para prestar tus servicios.

Algunas preguntas importantes que hay que hacer son:

- ¿Quién aprueba el trabajo?
- ¿Con quién debemos ponernos en contacto para temas de facturación / gestión / técnicos / estratégicos?
- ¿Cómo es el flujo de trabajo interno para creación de contenidos, imágenes, copies, tareas de desarrollo?

TU CAM

Reunión de Kickoff | una semana después del Email de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Siguientes pasos y acciones

La última parte de la reunión debe incluir:

- Un resumen rápido de los temas tratados
- Lista de las primeras acciones a implementar

TU CAM

3. Acta de seguimiento

TU CAM

Email de seguimiento | 24 horas después de la reunión de Kickoff

Temas que deben tratarse:

Después de la reunión inicial, hay que enviar un correo electrónico a todas las principales partes interesadas en el proyecto recapitulando lo que se discutió para que todos estén en la misma página.

TU CAM

Email de seguimiento | 24 horas después de la reunión de Kickoff


Ítems que debe incluir:

- Resumen de la reunión anterior.
- Solicitud de material necesario para la ejecución del proyecto.
- Solicitud de acceso al CMS y las herramientas pertinentes (*Analytics, Search Console, Google Ads, Facebook Ads, Hosting, etc.*)
- Una invitación al calendario para una reunión seguimiento recurrente: *es recomendable comenzar con una frecuencia quincenal durante los primeros dos o tres meses, y luego cambiar a reuniones mensuales.*
- Cualquier otro punto acordado durante la reunión inicial.
- Los primeros pasos con los que se empezará a trabajar.

TU CAM

Kickoff

Resumen y herramientas recomendadas



TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

TU CAM

Planificar

El objetivo de la planificación de proyectos no es, generar un plan y ejecutarlo minuciosamente. La idea central va mucho más allá, pues al crear el plan aprendemos mucho sobre el proyecto que más tarde seremos capaces de gestionarlo con cierta intuición. **Lo decisivo no es el plan, sino el proceso de planificación.**



ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Planificar

- Crear cronograma del proyecto basado en el presupuesto
- Establecer el equipo que ejecutará
- Determinar roles y responsabilidades
- Establecer Puntos de Contacto de Comunicación

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Planificar (Gantt)

- Es la mejor manera de representar gráficamente un proyecto.
- Todas las tareas están a la vista y está claro lo que hay que hacer, para cuándo y quién lo hace.



ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Planificar

- En cuanto tengas una idea general del proyecto, puedes descomponerlo y crear las fases de trabajo.
- Para proyectos complicados y difíciles de gestionar es muy útil agrupar las fases de trabajo para hacer entregas parciales funcionales.
- Es recomendado que expertos en el área revisen la planificación para evitar que hagan falta pasos fundamentales.

Aprendizajes BIGSEO

- Nunca pidas estimaciones con prisas.
- Implica a las personas que harán las tareas en la estimación.
- Las estimaciones nunca pueden ser ajustadas. Nadie trabaja siempre al 100%.
- Después de cada fase hacer una rápida reunión retrospectiva para identificar oportunidades de mejora en la ejecución y en la estimación.
- Firmeza. Una vez iniciado el proyecto no se pueden recortar los cronogramas ni los recursos.

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

ONBOARDING

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

PLANIFICAR

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

EJECUTAR

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Puntos de Contacto

El objetivo de tener puntos de contacto efectivos y que pongan al cliente, y sus objetivos, en el centro es brindarles una experiencia positiva y ganar su preferencia.

Experiencia del Cliente.

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO



TU CAM

Puntos de Contacto

Características de un buen punto de contacto:

- **Agradable:** genera engagement y contribuye para el agradar al cliente;
- **Conveniente:** ocurre a través del canal correcto, en el momento correcto, en un tono de acuerdo con la situación y el perfil del cliente;
- **Pertinente:** ofrece soluciones útiles, que atienden a las necesidades del cliente;
- **Eficiente:** interacción simple, ágil y dinámica;
- **Atento:** procesa profundamente la petición del cliente, identificando dolores, deseos y alternativas posibles;
- **Proactivo:** va más allá de las necesidades del cliente, sorprendiéndolo y evitando problemas futuros;
- **Empoderador:** el cliente gana confianza con nuestra servicio.

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Puntos de Contacto

Reuniones de estado del proyecto mensual

Mensual / Externa

¿Por qué hacerla?

Permite a todos los participantes del proyecto participar de los avances. Informa de los acontecimientos actuales, problemas y planes de acción.

Metodología

Primera parte: Así está el proyecto ahora y así estamos trabajando.

Segunda parte (opcional): aprobaciones y opiniones del cliente sobre next steps.

Tercera parte: preguntas y respuestas

Cuarta parte: otros asuntos

Preguntas post-reunión

¿Qué nueva información hemos adquirido?

¿Qué nos ha sorprendido?

¿Qué sugerencias deberíamos considerar?

¿Cómo afectan X decisiones a nuestro trabajo?

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

TU CAM

Ejecutar y Completar Tareas

- Gestionar el progreso del proyecto
- Comunicación con stakeholders
(internos y externos)
- Hacer ajustes necesarios
(presupuesto / cronograma)

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Ejecutar y Completar Tareas

**Reuniones
informativas diarias**

Diaria / Interna

¿Por qué hacerla?

Liberan de trabajo y aportan autoorganización. Los miembros del equipo determinan prioridades y asumen responsabilidades.

Metodología

Debe tener un horario y duración fija.

Se responden tres preguntas:

¿Qué hice ayer?

¿Qué me propongo hacer hoy?

¿Qué dificulta mi trabajo?

Lo que NO es esta reunión

No es una reunión de status del proyecto

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Ejecutar y Completar Tareas

**Reunión de equipo
orientada a
resultados concretos**

Mensual / Interna

¿Por qué hacerla?

Esta es una reunión que se enfoca en evaluar los resultados logrados por el equipo y crear un plan de mejora que se pondrá en marcha de inmediato.

Metodología

Cada miembro del equipo debe hablar de estos temas:

- ¿Qué ha funcionado bien en el último periodo?
- ¿Cuáles son las cosas que hay que mejorar?
- Problemas que hemos tenido para avanzar.
- Recomendaciones para aplicar

Beneficios de esta reunión

- Incrementa la calidad de nuestro servicio
- Aumenta el aprendizaje de los equipos
- Se consiguen mejoras colaborativas
- Las mejoras se aplican en el corto plazo mejorando la productividad

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Ejecutar y Completar Tareas

Formato de
seguimiento

*Permanente / Interno y
Externo*

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM

Ejecutar y Completar Tareas

BIGSEO
Nombre del Proyecto
Project Manager

#	ÁREA	Fase 1	TAREA	RECURRENCIA	ESTIMACIÓN	IMPORTANCIA	RESPONSABLE	ENLACES ÚTILES	KPI	NOTAS	ESTADO
1	SEO	Fase 1	Estudio de Palabras Clave				Marco Mei		Conocimiento		
2	SEO	Fase 1	Arquitectura SEO Transaccional				Marco Mei		Conocimiento		
3	SEO	Fase 1	Auditoría Técnica				Marco Mei		Conocimiento		
4	Contenidos	Ongoing	Identificar las 10 páginas TOP performers en GSC	Mensual	5 min	Alta	Marco Mei		CTR		Por hacer



TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

PUNTOS DE
CONTACTO

GESTIÓN DE
CRISIS

KICKOFF

KICKOFF

TU CAM


Gestión de Crisis

Cuando un proyecto no sale bien, las causas pueden discutirse con detalle posteriormente.

Pero, habría sido mejor reconocer el problema de antemano y evitarlo. Por eso vale la pena reflexionar antes de iniciar el proyecto:

¿Qué se puede tener en cuenta desde el primer momento para que el proyecto fracase?

Veamos 3 señales de alerta y cómo enfrentarlas:



TU CAM

Gestión de Crisis



Señal de Alerta: Euforia y Optimismo.

Es perfectamente normal encontrarse en esta situación, pero fácilmente el proyecto puede terminar siendo tan solo una ilusión.

Cómo Enfrentarla:

1. Realizar una estimación realista de tiempo, costes y esfuerzo.
2. Proponer escenarios: optimista, realista, pesimista.
3. Distribuir el proyecto en fases funcionales.
4. Ser valiente y saber identificar bajo qué condiciones el proyecto se debe parar.

TU CAM

Gestión de Crisis



Señal de Alerta: Sin Legitimación.

¿La estrategia planteada no tiene el apoyo del cliente? ¿Tiene misión y objetivos claros? Si la respuesta es negativa, vamos hacia un punto de no retorno.

Cómo Enfrentarla:

1. Comprobar que del lado del cliente tu interlocutor apoya el proyecto y lo entiende.
2. Acordar normas de cooperación y ejecución.
3. La relación con el cliente se debe caracterizar por la apertura y la confianza mutua.
4. Motivar al cliente a participar activa y personalmente del proyecto.

TU CAM

Gestión de Crisis



Señal de Alerta: Conocimiento Superficial y no Especializado.

¿No tienes la destreza necesaria, ni la experiencia para enfrentarte a un proyecto?

La falta de conocimiento no se suple a la misma velocidad que el proyecto requiere, esto es una realidad y lo ponemos en peligro.

Cómo Enfrentarla:

1. Aceptar proyectos que se mueven dentro del territorio conocido y pasar de aquellos que se distancian.
2. Si aceptas proyectos que tocan temas que desconoces, recurre a expertos externos.
3. En la medida de lo posible, retrasa el inicio del proyecto hasta tener un equipo capacitado para su ejecución.

TU CAM

Gestión de Crisis



Señal de Alerta: Objetivos Imprecisos y Poco Definidos.

El inicio del proyecto es una buena oportunidad para presentar al cliente los objetivos que queremos ayudar a cumplir y los beneficios que estos aportan a la empresa.

Si no somos claros en esta fase, no tendremos los apoyos necesarios.

Cómo Enfrentarla:

1. Presentar estrategias claras en las que se enumeren los objetivos, los beneficios, las oportunidades y los riesgos.
2. Todos los implicados (Cliente y Agencia) deben tener claros los objetivos y sus responsabilidades. También entender los beneficios de sacar adelante el proyecto.
3. Los objetivos debe ser redactados de tal forma que no dejen espacio para la interpretación.
4. Es fundamental aclarar qué pertenece al proyecto y que no forma parte de él.

TU CAM

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

HANDOFF DE
VENTAS

ACTIVACIÓN DEL
CLIENTE

KICKOFF

CRONOGRAMAS

PUNTOS DE
CONTACTO

KICKOFF

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE
CRISIS

TU CAM

Cerrar el Proyecto

- Verificar que todas las tareas se hayan completado
- Obtener la confirmación y OK por parte del cliente al resultado entregado
- Lecciones aprendidas (Retrospectiva)
- Comunicar resultados del proyecto a los stakeholders

ONBOARDING

PLANIFICAR

EJECUTAR

CERRAR EL
PROYECTO

TU CAM
